

嘉祥水利工程公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心 申报时间：2024年11月08日

申报部门：项目部

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
1	医用电梯	MEGA-MRL (1600kg-1.0m/s)		1	台	湘东区实验小学			产品名称:无机房医用客梯 产品型号:MEGA-MRL 额定速度:1.0 额定载重:1600 kg 基站:1、2、3、4 轿厢尺寸: CW*CD 1450*2350 井道尺寸: HW*HD 2600*2900 开门尺寸 1200*2100 顶层高度: 4550 其余层高度: 1F3600 2F3600 3F3600 底坑深度: 1800 开门方式: 中分门 轿厢前壁: 发纹不锈钢 轿厢后壁: 发纹不锈钢 轿厢侧壁: 发纹不锈钢 轿厢轿门: 发纹不锈钢 轿厢吊顶: 镜面不锈钢天花配 LED 照明 轿厢地板: PVC 地板胶 层楼外显示: 液晶 轿厢内显示: 液晶 层门: 发纹不锈钢 小门套: 发纹不锈钢 控制系统: 配语音报站, 侧壁扶手, 盲文按钮, 无障碍功能操纵箱住富电梯 门机系统: 住富电梯 主机: 住富电梯 电源: 拖动电源: 交流 380伏, 三相. 50赫 照明电源: 交流 220伏, 单相. 50赫
2	井道框架	3250*3050*15300		1	台	湘东区实验小学			

嘉祥水利工程有限公司2024年度工程物资采购计划表

项目名称：萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目-中心城区居家养老服务中心 申报时间：2024年11月18日

序号	物品名称	规格型号	材质	数量	单位	送货地点	送货时间	附图	备注
3	电梯底坑	3250*3050*1600		1	台	湘东区实验小学			
4	主电缆	10平方 5芯电缆		35	米	湘东区实验小学			
5	电梯门套	1100*2100		5	套	湘东区实验小学			

项目部物资采购计划人签字：杨俊

项目部分管领导签字：[Signature]

制表人签字：杨俊



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group Co., LTD

证书编号: A114013266(甲级)
A214013263(乙级)

建筑行业(建筑工程)甲级
农林行业(农业综合开发生态工程)专项甲级
风景园林工程设计专项甲级
环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级
市政行业乙级
农林行业(农业工程)乙级
化工石化医药行业乙级
电力行业(送电工程、变电气工程)专业甲级
煤炭行业(选煤厂、矿井)专业乙级
建材行业乙级
机械行业乙级

建设单位:

萍乡市湘东区峡山口街道办事处

工程名称:

萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务中心
网络建设项目


子项名称:

中心城区居家养老服务中心

图 名:

二、三层楼面拆板示意图
四层楼面拆梁、板示意图


	姓名		签名
	姓 名	姓 名	
项目负责人	杨 旭	杨 旭	
专业负责	任小军	任小军	
审核	任小军	任小军	
校对	张 健	张 健	
设计	艾 丽	艾 丽	
工程编号			
设计阶段	施工图		
专业	结构	图号	JG-02
比例	1:100	日期	2024.07

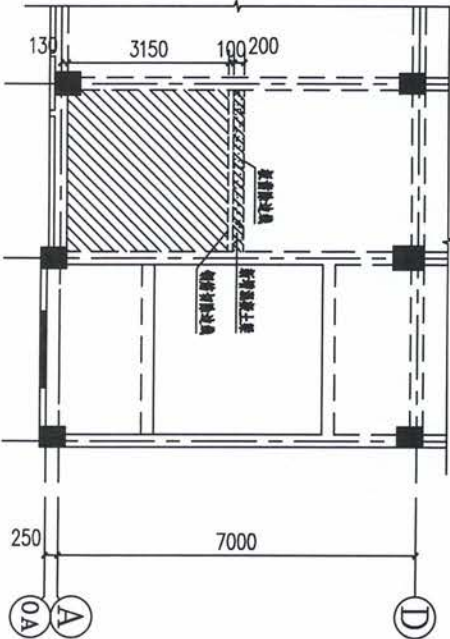

二、三层楼面拆板示意图
1:100

原有结构需保留具体要求:

- 1)、拆除前需对原有结构及大设计图纸核对无误,且必须具有可靠安全保障及结构时量测数据,方可施工。拆除时必须采用无震动施工,严禁使用可能对原有结构造成破坏作用的开凿机械。
- 2)、拆除部分施工时应不得破坏原有结构保留的构件,并对拆除后构件进行相应处理:采用高压水冲开干净拆除混凝土的渣渣面,在混凝土充分湿润后,用水泥冲浆或专业厚胶漆刷一层,最后按照原设计要求进行施工。

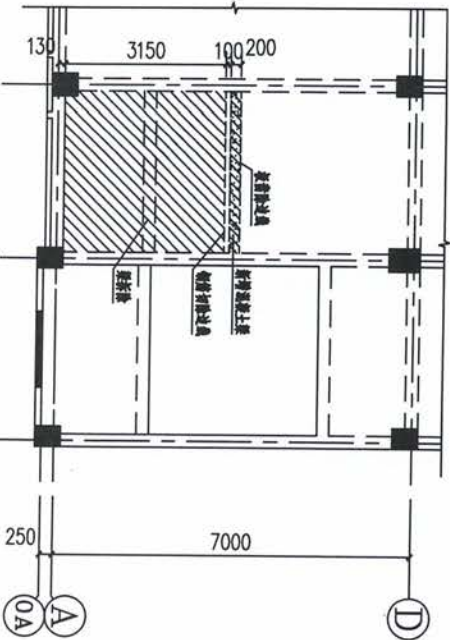

四层楼面拆梁、板示意图
1:100

原有结构需保留具体要求:

- 1)、拆除前需对原有结构及大设计图纸核对无误,且必须具有可靠安全保障及结构时量测数据,方可施工。拆除时必须采用无震动施工,严禁使用可能对原有结构造成破坏作用的开凿机械。
- 2)、拆除部分施工时应不得破坏原有结构保留的构件,并对拆除后构件进行相应处理:采用高压水冲开干净拆除混凝土的渣渣面,在混凝土充分湿润后,用水泥冲浆或专业厚胶漆刷一层,最后按照原设计要求进行施工。



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group CO., LTD

证书编号: A114013266(甲级)

A214013263(乙级)

建筑行业(建筑工程)甲级
农林行业(农业工程)专项甲级
风景园林工程设计专项甲级
环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级
市政行业乙级
农林行业(林业工程)乙级
化工石化医药行业乙级
电力行业(送电工程、变电工程)专业甲级
煤炭行业(煤矿)、矿业专业乙级
机械行业乙级

建设单位:

萍乡市湘东区峡山口街道办事处

工程名称:

萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务中心
网络建设项目

子项名称:

中心城区居家养老服务中心

图 名:

屋面拆板示意图
柱平法施工图

姓名

签名

项目负责人

杨旭

专业负责

任小军

审核

任小军

校对

张健

设计

艾丽

工程编号

施工图

设计阶段


施工图

专业

结构

比例

1:100 日期 2024.07

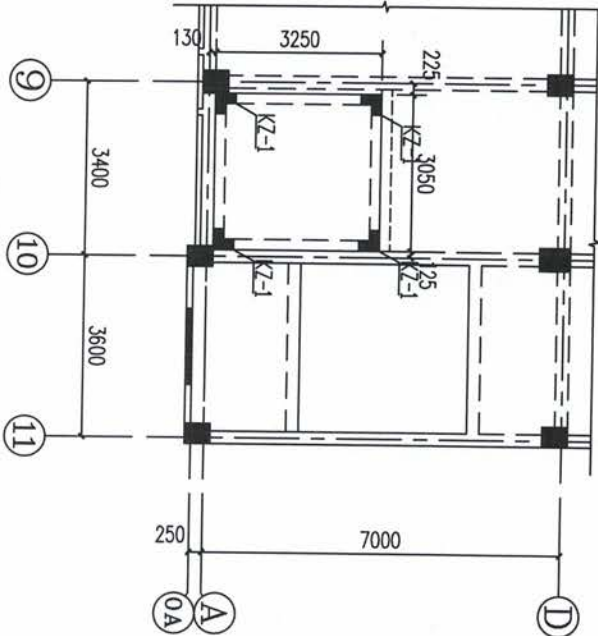

柱平法施工图
1:100
1. 柱截面尺寸为C25.


柱明细表

截面	柱号
	KZ-1
截面	柱号
柱号	柱号
截面	柱号
截面	柱号

屋面拆板示意图
1:100

原有结构图例:

- 1). 拆除前对原有结构及本设计图例进行复核,且必须具有可靠的安全保障及防护措施,方可施工,拆除时必须先拆除无支护部分,严禁使用可能对原有结构造成破坏的拆除机械。
- 2). 拆除部分的结构工程不得有保留的拆除部分,并对拆除后的结构进行加固处理;采用高压水枪冲刷干净后,在拆除上无分道后,用木板冲成中空且其厚度一层,最后再按照原图进行施工。

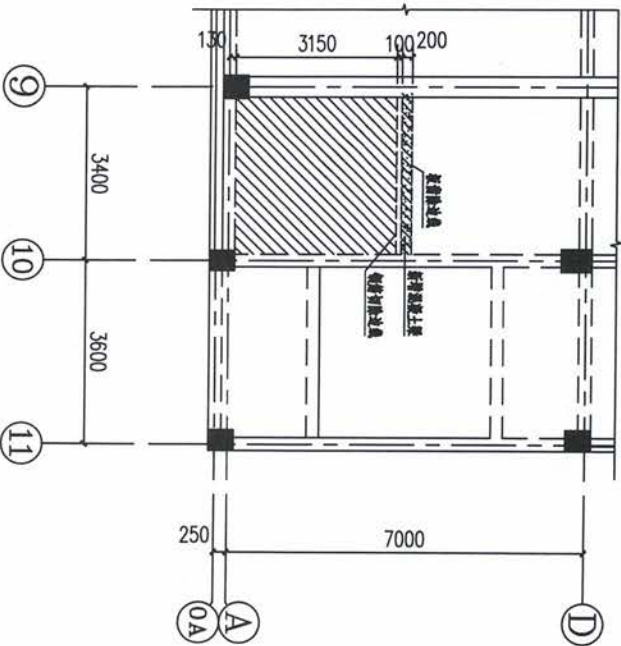



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGKESHENGHUA Engineering Group CO., LTD

证书编号: A114013256(甲级)

A214013253(乙级)

建筑行业(建筑工程)甲级

农林行业(农业综合开发生态工程)专项甲级

风景园林工程设计专项甲级

环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级

市政行业乙级

农林行业(农业工程)乙级

化工石化医药行业乙级

电力行业(送电工程、变电工程)专业丙级

煤炭行业(煤矿、矿用)专业乙级

建材行业乙级

机械行业乙级

建设单位:

萍乡市湘东区峡山口街道办事处

工程名称:

萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务中心
网络建设项目

子项名称:

中心城区居家养老服务中心

图 名:

三层梁平法施工图
四层梁平法施工图

姓名	签名
项目负责人	杨旭
专业负责	任小军
审核	任小军
校对	张健
设计	艾丽

工程编号

设计阶段


专业

结构

图号


日期

比例

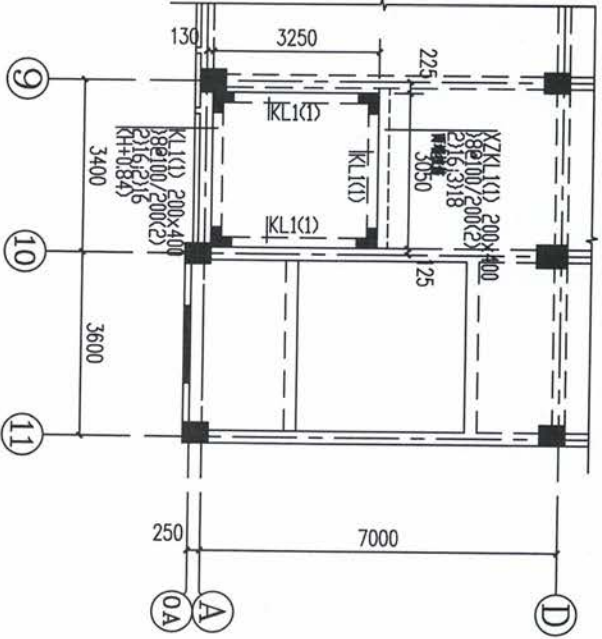

四层梁平法施工图
1:100

- 说明
1. 本图与图例26G101-1配合使用, 梁柱节点及配筋构造详图按26G101-1.
 2. 主梁在次梁侧边中部截断3根钢筋, 截断长度同主梁, 间距50, 未注明截断为2/14.
 3. 图中未注明梁截面为梁截面按H=10.800.
 4. 梁截面高度为C25.
 4. 梁截面中钢筋与支墙锚固长度不同, 未注明中钢筋与支墙锚固, 锚固长度按锚固长度要求.
 6. 未注明梁截面尺寸时, 按图例中, 锚固长度按图例中锚固长度.

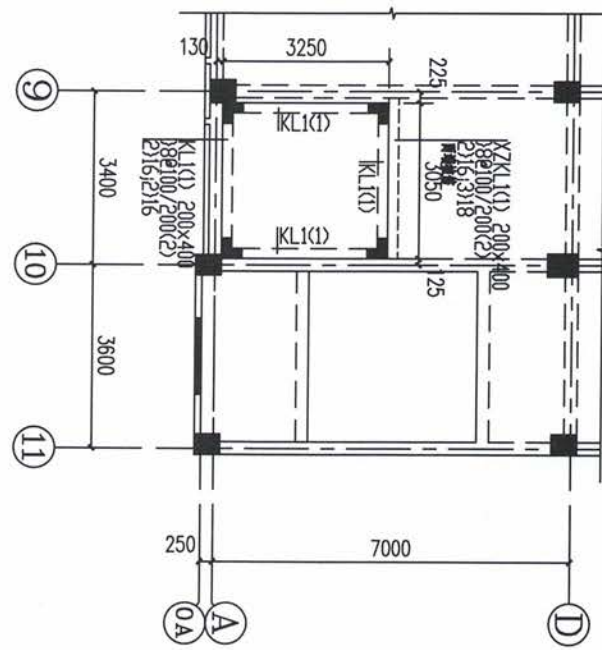

三层梁平法施工图
1:100

- 说明
1. 本图与图例26G101-1配合使用, 梁柱节点及配筋构造详图按26G101-1.
 2. 主梁在次梁侧边中部截断3根钢筋, 截断长度同主梁, 间距50, 未注明截断为2/14.
 3. 图中未注明梁截面为梁截面按H=7.200.
 4. 梁截面高度为C25.
 4. 梁截面中钢筋与支墙锚固长度不同, 未注明中钢筋与支墙锚固, 锚固长度按锚固长度要求.
 6. 未注明梁截面尺寸时, 按图例中, 锚固长度按图例中锚固长度.



中科盛华工程集团有限公司

ZHONGSHENGHUA Engineering Group Co., Ltd.

证书编号: A114013266(甲级)
A214013263(乙级)

建筑行业(建筑工程)甲级
农林行业(农业综合开发工程)专项甲级
风景园林工程设计专项甲级
环境工程设计专项(水污染防治工程)甲级
市政行业(市政工程)乙级
农林行业(林业工程)乙级
化工石化医药行业乙级
电力行业(送电工程、变电工程)专业内级
煤炭行业(送电工程、变电工程)专业乙级
建材行业乙级
机械行业乙级

建设单位:

萍乡市湘东区峡山口街道办事处

工程名称:


萍乡市湘东区峡山口社区居家养老服务网络建设项目

子项名称:


中心城区居家养老服务中心

图 名:


植筋大样

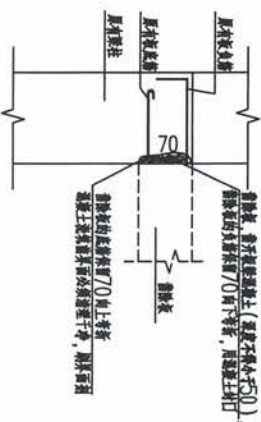

1. 本节适用于植筋封口。

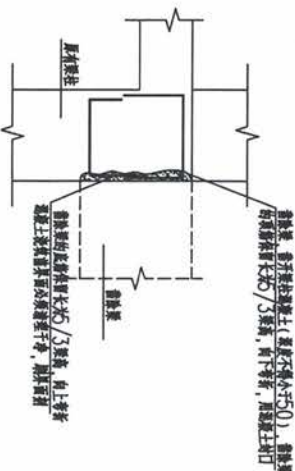


1. 本节适用于植筋封口。

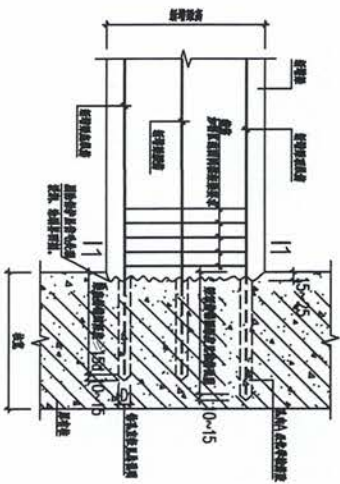


新梁梁架与原有梁柱的连接

1. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
2. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
3. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。

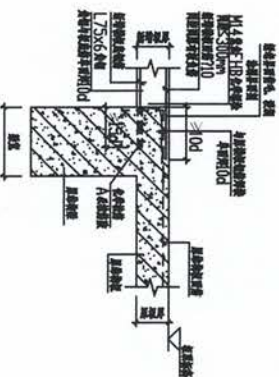


新梁梁架与原有梁柱的连接

1. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
2. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
3. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。



新梁梁架与原有梁柱的连接

1. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
2. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
3. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
4. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
5. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。

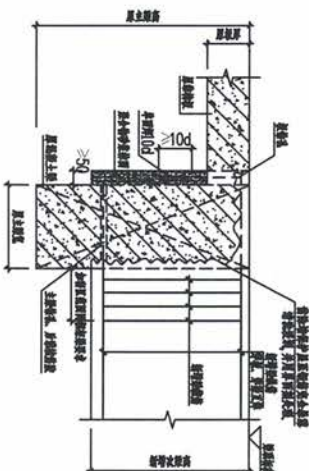

新梁梁架与原有梁柱的连接

1. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
2. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
3. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。
4. 2. 本节适用于新梁梁架与原有梁柱的连接。

姓名	签名
杨旭	杨旭
任小军	任小军
任小军	任小军
张健	张健
艾丽	艾丽

项目负责	杨旭
专业负责	任小军
审核	任小军
校对	张健
设计	艾丽

工程编号	
设计阶段	施工图
专业	结构
比例	1:100
日期	2024.07

